


**Nazwa zadania:** Budowa magistrali wodociągowej ze Stacji Wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu.

**Zakres rzeczowy:** Projekt obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową magistrali wodociągowej DN600 na odcinku od stacji wodociągowej Mała Nieszawka do ul. Szosa Okrężna w Toruniu o długości ca 4,8 km, w tym ułożenie pod dnem rzeki Wisły dwóch równoległych przewodów 2xDN500 o łącznej długości ca 1.4 km.

### Lokalizacja inwestycji:

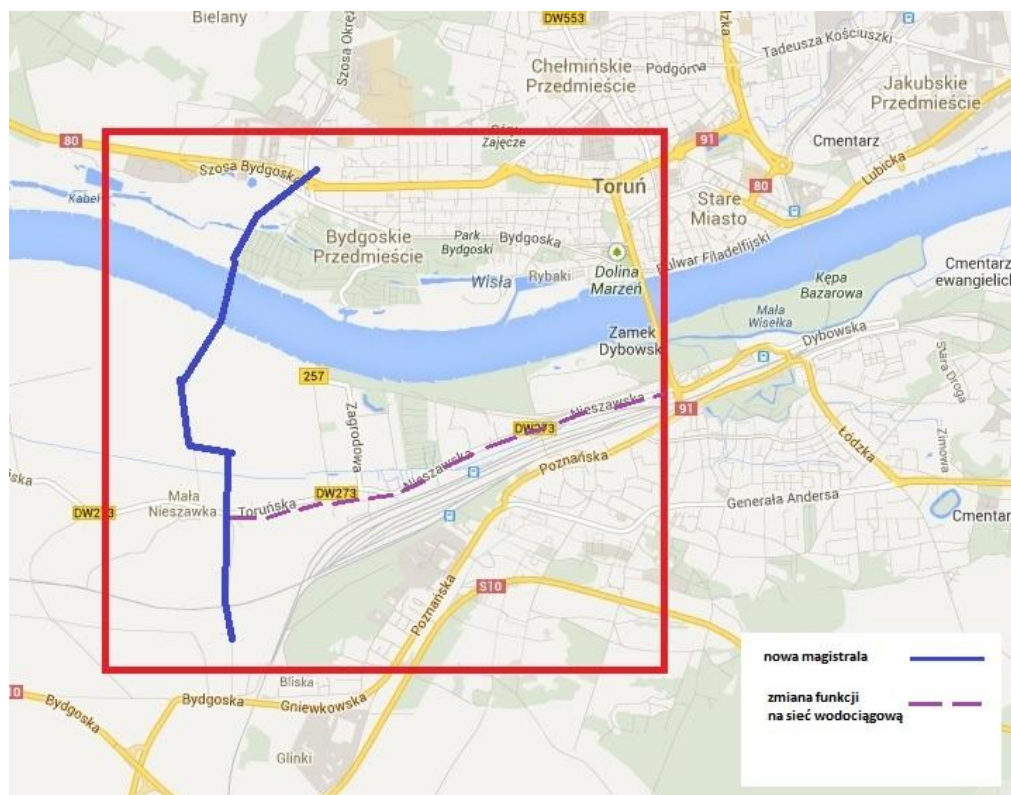

**Wykonawca:** Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Sp.j. Grudziądz, ul. Budowlanych 3

**Wartość umowy:** 8 319 023,22 PLN (netto)

**Okres realizacji zgodnie z umową:** 31.01.2014 – 15.03.2015

## **STAN REALIZACJI – POSTĘP PRAC, STAN NA 30-07-2014:**

### **1. W zakresie realizacji zadania:**

W miesiącu czerwcu i lipcu Wykonawca wykonał 909,30 m magistrali wodociągowej  $\phi$  630/37,4 mm z rur PE, zarówno w obszarze Gminy Wielka Nieszawka jak i Gminy Miasta Toruń, w tym przecisk pod torami linii kolejowej nr 18. Narastająco, od początku realizacji inwestycji Wykonawca wykonał 2 455,16 m magistrali wodociągowej, co stanowi ok. 51,1% całego zakresu rzeczowego zadania.

#### 1.1 Wykonanie przecisku pod torami kolejowymi.



## 1.2 Budowa komory.



### **2. Zaawansowanie finansowe Kontraktu:**

Zaawansowanie finansowe narastająco od początku realizacji inwestycji wynosi 29,46 %.

### **3. Ocena stanu realizacji Kontraktu - podsumowanie**

Prace na placu budowy postępują zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem. Nie występuje zagrożenie niedotrzymania terminu końcowego.
