


Nazwa zadania: Budowa magistrali wodociągowej ze Stacji Wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu.

Zakres rzeczowy: Projekt obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową magistrali wodociągowej DN600 na odcinku od stacji wodociągowej Mała Nieszawka do ul. Szosa Okrężna w Toruniu o długości ca 4,8 km, w tym ułożenie pod dnem rzeki Wisły dwóch równoległych przewodów 2xDN500 o łącznej długości ca 1.4 km.

Lokalizacja inwestycji:

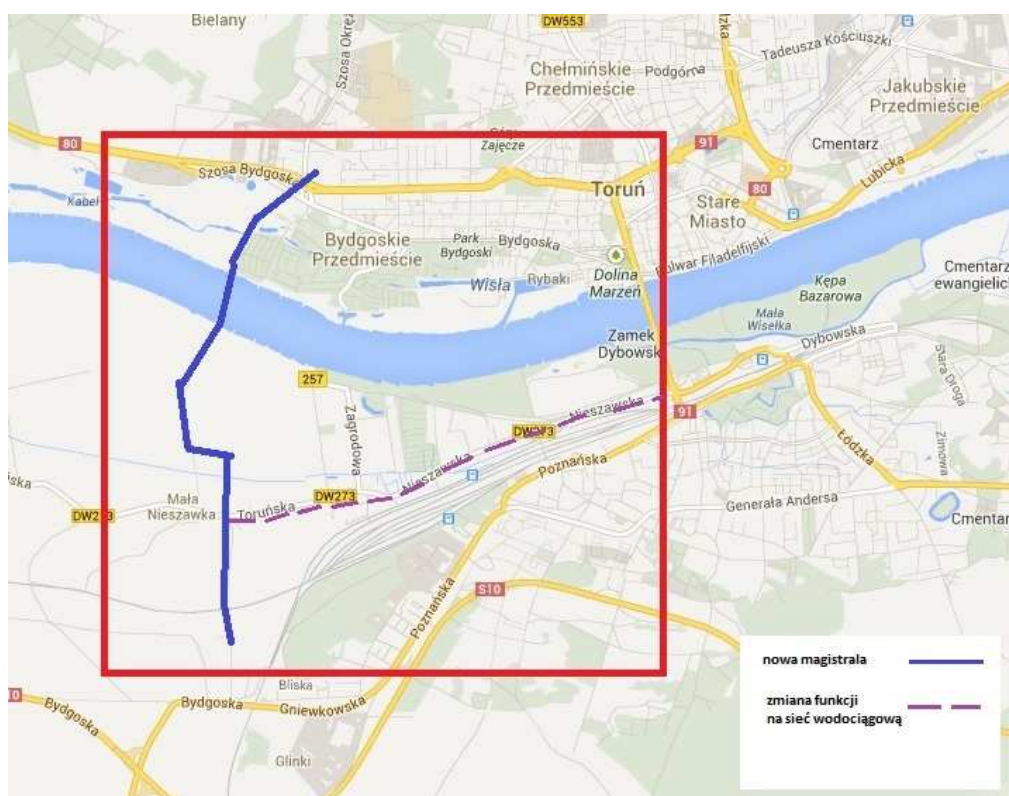

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Sp.J. Grudziądz, ul. Budowlanych 3

Wartość umowy: 8 319 023,22 PLN (netto)

Okres realizacji zgodnie z umową: 31.01.2014 – 15.03.2015

STAN REALIZACJI – POSTĘP PRAC, STAN NA 30-03-2014:

1. W zakresie realizacji zadania:

Wykonawca wykonał 522m magistrali wodociągowej od komór pomiarowych w kierunku ulicy Toruńskiej (tereny rolnicze) w obszarze Gminy Wielka Nieszawka, co stanowi 11% całego zakresy rzeczowego zadania.

1.1 Zgrzewanie przewodów wodociągowych



1.2 Przy ul. Toruńskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wodociągową, Wykonawca postawił tablicę informacyjną.



2. Zaawansowanie finansowe Kontraktu:

Roboty wykonane w miesiącu marcu zostały zafakturowane przez Wykonawcę na kwotę netto 425 674,50 zł, co stanowi ok. 5% zaawansowania finansowego inwestycji.

3. Ocena stanu realizacji Kontraktu - podsumowanie

Prace na placu budowy postępują zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem. Nie występuje zagrożenie niedotrzymania terminu końcowego.
