


**Nazwa zadania:** Budowa magistrali wodociągowej ze Stacji Wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu.

**Zakres rzeczowy:** Projekt obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową magistrali wodociągowej DN600 na odcinku od stacji wodociągowej Mała Nieszawka do ul. Szosa Okrężna w Toruniu o długości ca 4,8 km, w tym ułożenie pod dnem rzeki Wisły dwóch równoległych przewodów 2xDN500 o łącznej długości ca 1.4 km.

### Lokalizacja inwestycji:

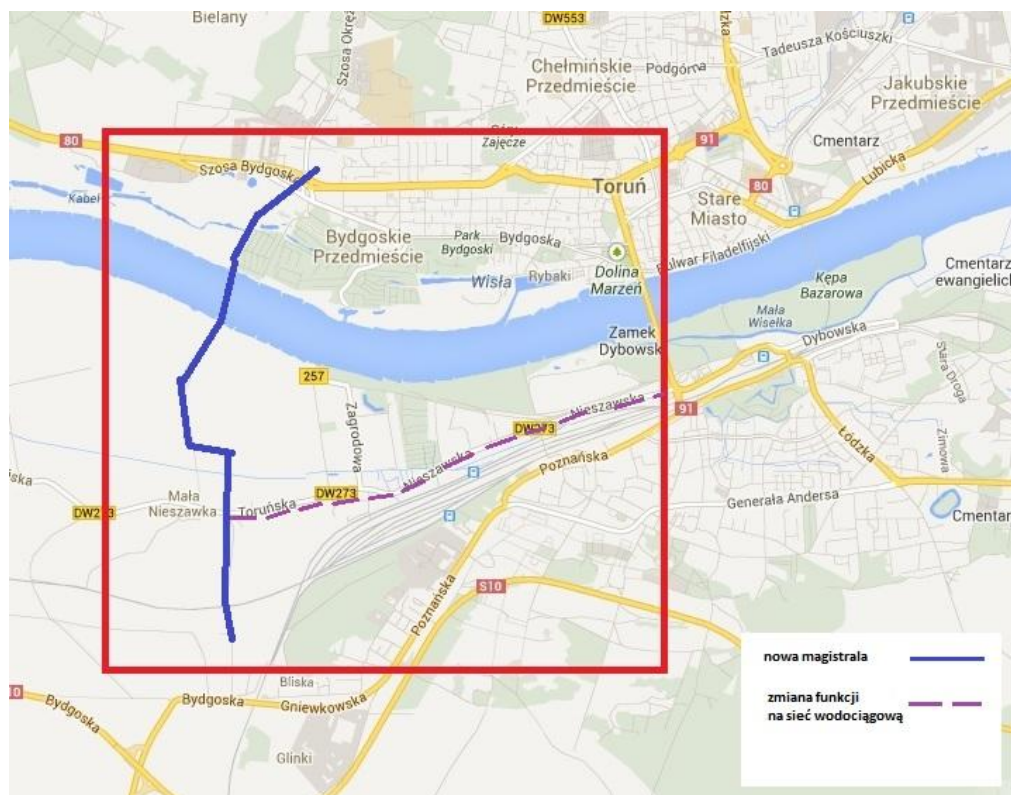

**Wykonawca:** Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Sp.j. Grudziądz, ul. Budowlanych 3

**Wartość umowy:** 8 319 023,22 PLN (netto)

**Okres realizacji zgodnie z umową:** 31.01.2014 – 15.03.2015

## **STAN REALIZACJI – POSTĘP PRAC, STAN NA 30-09-2014:**

### **1. W zakresie realizacji zadania:**

W miesiącu sierpniu i wrześniu Wykonawca wykonał 1 035,88 m magistrali wodociągowej

φ 630/37,4 mm z rur PE, zarówno w obszarze Gminy Wielka Nieszawka jak i Gminy Miasta Toruń, w tym m.in. przecisk pod ul. Toruńską w Małej Nieszawce. Narastająco, od początku realizacji inwestycji Wykonawca wykonał 3 491,04 m magistrali wodociągowej, co stanowi ok. 64% całego zakresu rzeczowego zadania.

#### 1.1 Wykonanie przecisku pod ul. Toruńską.





1.2 Węzeł wodociągowy w ul. Toruńskiej.



1.3 Komora redukcyjna przy ul. Toruńskiej



## **2. Zaawansowanie finansowe Kontraktu:**

Zaawansowanie finansowe narastająco od początku realizacji inwestycji wynosi 46,42 %.

## **3. Ocena stanu realizacji Kontraktu - podsumowanie**

Prace na placu budowy postępują zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem. Nie występuje zagrożenie niedotrzymania terminu końcowego.

W ostatnim kwartale 2014 r. Wykonawca zaplanował wykonanie przewiertu pod dnem Wisły.
