Nazwa zadania: Budowa magistrali wodociągowej ze Stacji Wodociągowej Mała Nieszawka do Szosy Okrężnej w Toruniu.

Zakres rzeczowy: Projekt obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową magistrali wodociągowej DN600 na odcinku od stacji wodociągowej Mała Nieszawka do ul. Szosa Okrężna w Toruniu o długości ca 4,8 km, w tym ułożenie pod dnem rzeki Wisły dwóch równoległych przewodów 2xDN500 o łącznej długości ca 1.4 km.

Lokalizacja inwestycji:

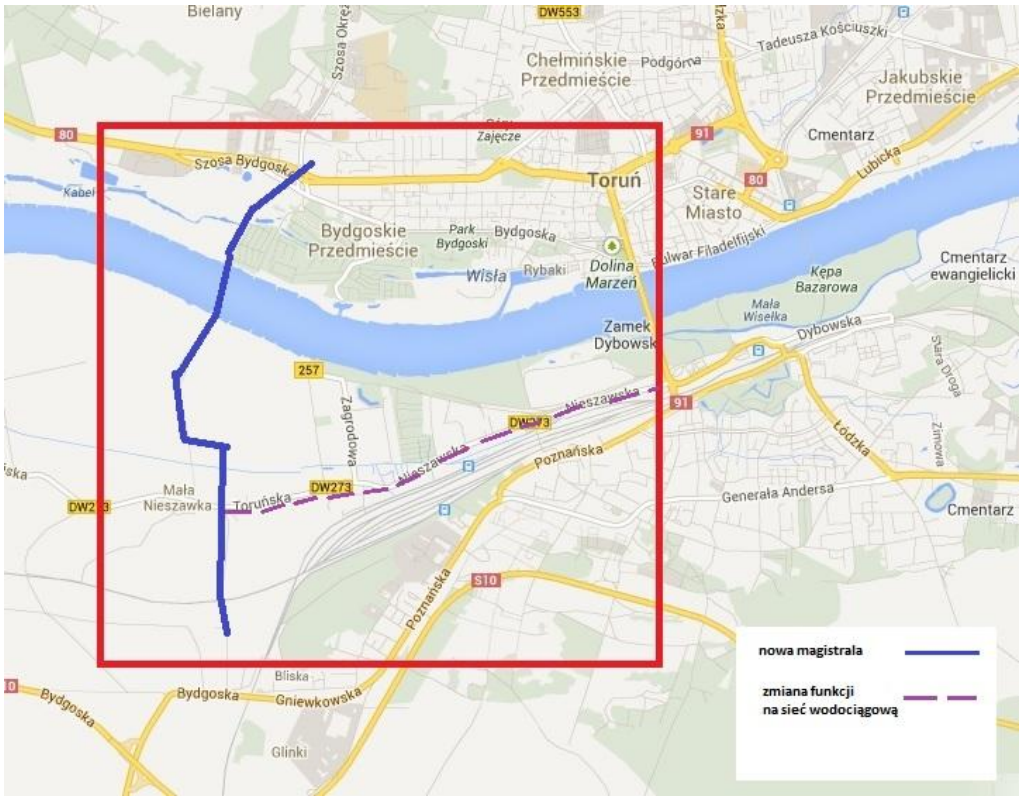

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Sp.j. Grudziądz, ul. Budowlanych 3
Wartość umowy: 8 319 023,22 PLN (netto)
Okres realizacji zgodnie z umową: 31.01.2014 – 15.03.2015

STAN REALIZACJI – POSTĘP PRAC, STAN NA 30-05-2014:

1. W zakresie realizacji zadania:

W miesiącu maju Wykonawca wykonał 404,05 m wodociągu ϕ 630/37,4 mm z rur PE, w całości w obszarze Gminy Wielka Nieszawka, w tym przejście pod Kanałem Nieszawskim. Narastająco, od początku realizacji inwestycji Wykonawca wykonał 1 545,85 m magistrali wodociągowej, co stanowi ok. 28,5% całego zakresu rzeczowego zadania.

1.1 Układanie przewodu magistralnego pod Kanałem Nieszawskim – na zdjęciu widoczny jest tymczasowy przepust, którym na czas wykonywania prac płynęły wody Kanału Nieszawskiego oraz przewód magistralny montowany przy użyciu koparki

1.2 Układanie przewodu magistralnego pod Kanałem Nieszawskim – na zdjęciu widoczna końcówka przewodu magistralnego za Kanałem Nieszawskim, która łączona była z wcześniej wykonanym fragmentem przewodu.

2. Zaawansowanie finansowe Kontraktu:

Zaawansowanie finansowe narastająco od początku realizacji inwestycji wynosi 17,4%.

3. Ocena stanu realizacji Kontraktu - podsumowanie

Prace na placu budowy postępują zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem. Nie występuje zagrożenie niedotrzymania terminu końcowego.
